

LINDBLAD & PIANA SRL

Via Mugello 70

00141 Roma

Tel: 06 8125617 – 06 8863317

Fax: 06 8104848

e-mail: lindblad@tin.it

www.fotocontrollo.com



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Modello apparecchio:

Traffiphot IIISR-PhotoR&V

Matricola:

593 - 100 / 60908

Approvazione:

Protocollo N. 4130 del 24 dicembre 2004
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione

La sottoscritta Società, rappresentante in esclusiva per l'Italia della casa tedesca Robot Visual Systems GmbH (Gruppo Jenoptik), dichiara che l'apparecchio in questione è conforme al prototipo depositato presso il Ministero.

In fede

Roma, 10 settembre 2007

LINDBLAD & PIANA SRL
CONSIGLIERE DELEGATO

Christian Lindblad

robot



traffipax

CAPITALE SOCIALE € 102.770,00 – CODICE FISCALE 00722540580 – PARTITA IVA 00926191008

C.C.I.A.A. 331149 – REGISTRO IMPRESE TRIBUNALE DI ROMA 1425/70

TEST DI VERIFICA FUNZIONAMENTO

Apparecchiatura: TPH IIISR-PhotoR&V

matricola: 593-100 / 60908

O.K.

Accensione unità, flash e SmartCamera

☒

Controllo spie gruppo alimentatore

☒

Controllo inserimento data, ora e codice

☒

Verifica parametro "Loop distance"

☒

Verifica parametro "Sensitivity"

☒

Verifica parametro "Frequency level"

☒

Verifica parametri "Interval", "Red Delay" e "Max. Red"

☒

Verifica del Locking Time

☒

Verifica velocità a display prodotta dal simulatore **Speed Induction Simulator W163**

☒

Controllo inserimento limite della velocità durante la fase verde

☒

Prova violazione del limite di velocità con simulatore **Speed Induction Simulator W163**

Controllo inserimento limite della velocità durante la fase rossa

4

Prova violazione fase rossa con simulatore fase semaforica e **Speed Induction Simulator W163**☐

Controllo funzionamento del flash interno

☒

Lettura e reset del contatore dei transiti e delle infrazioni

☒

Verifica corretto funzionamento oscillatore interno base tempi (frequenza di 1 MHz)

Y

Verifica corretto funzionamento comunicazione Lan smartcam (bif User)

☒

Firma del tecnico :

Data :

30 JAN. 2007

bot

Mr. MopeX

TEST DI VERIFICA FUNZIONAMENTO

Misura dei tempi di inizio delle fasi "rosso/giallo" e dei tempi di intervallo


Tutti i tempi relativi alle misurazioni sono prodotti dalla scheda elettronica dell'interfaccia II. La frequenza dell'oscillatore che genera la base dei tempi è di 1MHz.

Se tale frequenza rimane stabile con una tolleranza massima di $\pm 500\text{Hz}$ possiamo avere la garanzia che i tempi derivati sono anch'essi corretti. La frequenza viene controllata attraverso due prese di misura, inserite direttamente nel pannello frontale dell'interfaccia II, mediante l'uso di un adeguato strumento di misura.

Apparecchiatura: TPH IIISR-PhotoR&V

matricola: 593-100 / 60908

O.K.

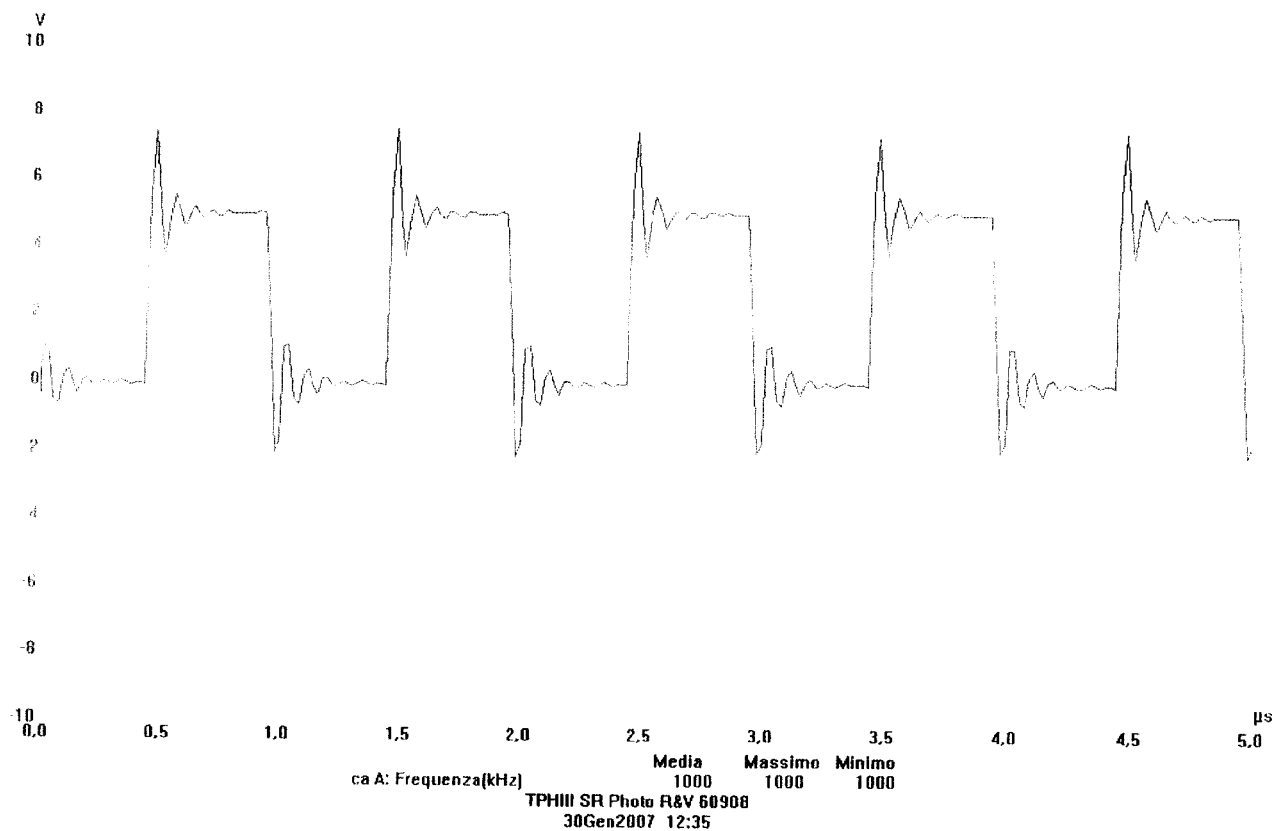

Firma del tecnico :

Peppino Alessandrini

Data :

30 JAN. 2007

bot



tr ffipax

Inspection TPH-III SR for Lindblad

Ordernumber: 44334

Inner Housing Nr.: 593-100/60908

Description of the test:



Preparation

Compleat conection between TPH-III SR, Power, additional flash and simulator

Test

	O.K.
Check of the ON/OFF switch from TPH-III SR, additional flash and SmartCamera	☒
Starting Unit	☒
Setting Time, Date and Code	☒
Setting Parameter "Loop Distance"	☒
Setting Parameter " Sensivity"	☒
Setting Parameter " Frequency Level"	☒
Setting "Interval", "Red Delay" and "Max. Red"	☒
Setting Speed Limit during "Red Light"	☒
Setting Speed Limit during "Green Light"	☒
Setting Position of the 1st Photo	☒
Setting and Activating a Locking Time	☒
Generate speed violation with help of the simulator	☒
Check of the internal flash	☒
Check of the generated speed on the display of the TPH-III SR	☒
Reading and Resetting the Traffic Counter	☒
Download the picture from the SmartCamera / Motor Recorder	☒
Check of the picture	☒

Signature Inspector: 

Date: 18.01.2007
