COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Servizio Lavori Pubblici

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ADDUZIONE ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

SOGGETTO ATTUATORE

INTERPORTO BOLOGNA SPA

REFERENTE TECNICO
Arch. Alessandro Gaiani

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DIRITTORE AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Elena Chiarelli

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ
Ing. Pietro Luminasi

REFERENTE TECNICO
Ing. Francesco Vitale

PROGETTODEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE GENERALE

PARTE GENERALE

DIAGRAMMA DEI LAVORI

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Michele Angelo Parrella Ord. Ingg. Avellino N. 933	Ing. Michele Angelo Parrella Ord. Ingg. Avellino N. 933 **PROJECT ENGINEER**	Ing. Andrea Tanzi Ord. Ingg. Parma N. 1154

CODICE IDENTIFICATIVO

RIFERIMENTO PROGETTO				RIFERIMENTO DIRETTORIO					RIFERIMENTO ELABORATO				Ordinatore:
Codice Commessa	Lotto, Sub-Prog, Cod. Appalto	Fase		Capitolo	Paragrafo	WBS tipologia	WBS progressivo	PARTE D'OPERA	Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.	
571001	SP01	PD		DG	GEN	00000	00000		S	GEN	0003	-0	SCALA: -

spea ENGINEERING gruppo Atlantia	PROJECT MANAGER:	SUPPORTO SPECIALISTICO:	REVISIONE n.	REVISIONE data
			0	APRILE 2020
	REDATTO:	VERIFICATO:		

DIAGRAMMA DEI LAVORI

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

spea ENGINEERING group Atlantia

ID	Nome attività	Durata
1	**F01 - OPERAZIONI PRELIMINARI**	**30 g?**
2	Consegna lavori	1 g?
3	Permessi, acquisizione aree ed interferenze	30 g
4	Accessi, segnaletica recinzione - tracciamenti	30 g
5	Apprestamento campo base/campo operativo	30 g
6	**F02 - LAVORI**	**344 g**
7	**Intervento 1- Rotatoria sulla SP 44 Bassa Bolognese con via Santa Maria in Duno e Accesso Nord Interporto**	**134 g**
8	Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico	15 g
9	Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata (rami e rotatoria)	30 g
10	Riposizionamento barriere provvisionali e spostamento del traffico lungo la nuova rotatoria	5 g
11	Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione	25 g
12	Ramo 1	5 g
13	Ramo 2	5 g
14	Ramo 3	5 g
15	Ramo 4	10 g
16	Isole centrale: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione	10 g
17	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione	20 g
18	Completamento della pavimentazione con lo strato di usura	7 g
19	Posa barriere di sicurezza	15 g
20	Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale	7 g
21	**Intervento 2- Rotatorie su SP4 Galliera con SP44 Bassa Bologne e con SP42 Centese**	**210 g**
22	Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico	20 g
23	Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata (rami e rotatorie)	60 g
24	Riposizionamento barriere provvisionali e spostamento del traffico lungo le nuove rotatorie	10 g
25	Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione	50 g
26	Ramo 1A	10 g
27	Ramo 2A	10 g
28	Ramo centrale	10 g
29	Ramo 1B	10 g
30	Ramo 2B	10 g
31	Isole centrale: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione	10 g
32	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione	20 g
33	Completamento della pavimentazione con lo strato di usura	10 g
34	Posa barriere di sicurezza	20 g
35	Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale	10 g
36	**Intervento 3 - Rotatoria sulla SP4 Galliera con Via Marconi - Sistemazione Piazzale Stazione FS**	**145 g**
37	Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico	20 g
38	Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata (rami e rotatoria)	30 g
39	Riposizionamento barriere provvisionali e spostamento del traffico lungo la nuova rotatoria	5 g
40	Sistemazione Piazzale Stazione FS - Nuove cordonature	90 g
41	Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione	30 g
42	Ramo 1	10 g
43	Ramo 2	10 g
44	Ramo 3	10 g
45	Isole centrale: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione	10 g
46	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione	20 g
47	Completamento della pavimentazione con lo strato di usura	10 g
48	Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale	7 g
49	**Intervento 4 - Sistemazione sulla SP4 per innesto di via Panzacchi**	**70 g**
50	Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico	10 g
51	Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata	20 g
52	Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione	20 g
53	Completamento della pavimentazione con lo strato di usura	10 g
54	Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale	10 g
55	**Intervento 5- Rotatoria sulla SP 44 Bassa Bolognese con via Marconi**	**139 g**
56	Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico	15 g
57	Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata (rami e rotatoria)	30 g
58	Riposizionamento barriere provvisionali e spostamento del traffico lungo la nuova rotatoria	5 g
59	Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione	30 g
60	Ramo 1	10 g
61	Ramo 2	10 g
62	Ramo 3	10 g
63	Isole centrale: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione	10 g
64	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione	20 g
65	Completamento della pavimentazione con lo strato di usura	7 g
66	Posa barriere di sicurezza	15 g
67	Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale	7 g
68	**F01 - OPERAZIONI FINALI**	**45 g**
69	Rimozione cantiere	30 g
70	Ripristini ambientali	15 g

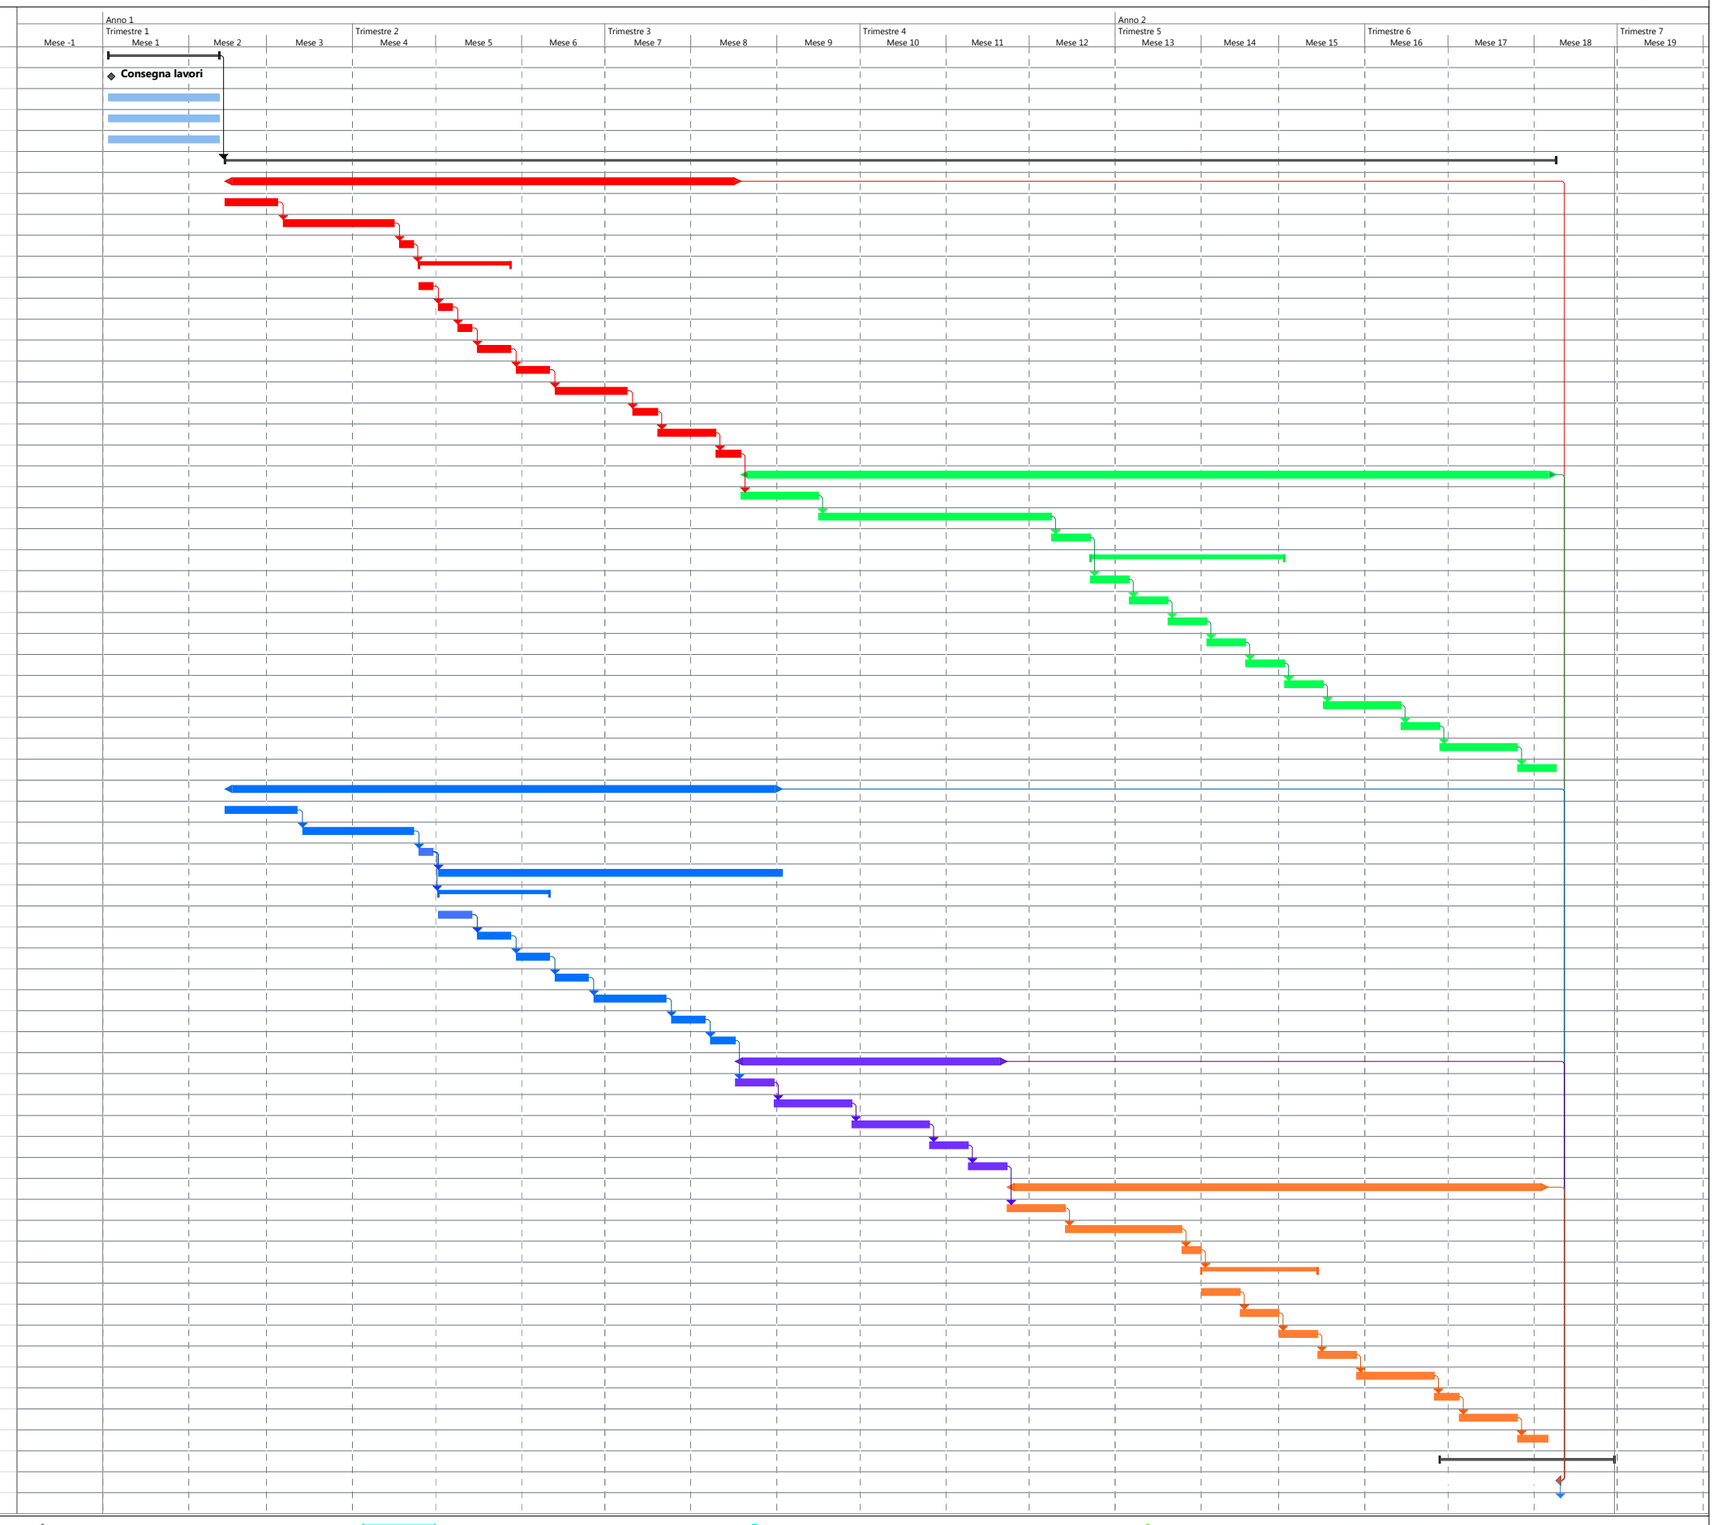

Progetto: GEN0003_ROTATOR
Data: mar 05/05/20

Attività · Divisione · Cardine · Riepilogo · Riepilogo progetto · Attività inattiva · Cardine inattiva · Riepilogo inattiva · Attività manuale · Solo-durata · Riporto riepilogo manuale · Riepilogo manuale · Solo inizio · Solo-fine · Attività esterne · Cardine esterno · Scadenza · Avanzamento · Avanzamento manuale
